

SSV Skördegatans förskola Oktober 2024




Fakta om SSV Skördegatans förskola

Renovering av befintlig förskola, samt utbyggnad av ca 430m² ny förskoleyta inklusive förskolegård. Arbeten kommer att utföras i två etapper med pågående verksamheten i dem delarna som inte omfattas av renoveringen.

Etapp 1 – nybygge av hus D och renovering av hus C. Pågående verksamhet i hus A och B.

Etapp 2 – nybygga av hus D och renovering av hus A och B. Pågående verksamhet i hus B och C.

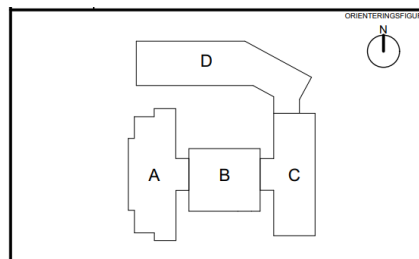

Det här är klart eller pågår

Fettavskiljaren är på plats, installationsarbete och driftsättning kommer att göras under våren-sommaren 2025. Rivning tak Hus B och C är klart och arbetet med nytt tak pågår. Bottenplattan Hus D är klar. Installationsarbete i Hus C pågår, enkling innerväggar och gips i tak är klara arbeten.

Det här är på gång

Stomresning hus D börjar v.46. Under v.47 kommer ställningen runt Hus B och C att rivas.

Ställning för takarbeten Hus D kommer upp under v.47–48.

I Hus C kommer vi att dubbla innerväggar under v.45, målningsarbeten planeras börja v.46.

Markarbeten fortsätter som planerat och målet är att göra klart ytan utanför Hus C innan vintern slår till.

Värt att notera

Så här långt in i projektet ligger vi i fas och följer vår tidplan.

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Adnan Delkic

Platschef, Serneke Sverige AB

adnan.delkic@serneke.se

079 066 31 12



Gjutning bottenplatta Hus D 25/10



Gjutning bottenplatta Hus D 25/10



Nytt tak hus B och C är på gång



Invändiga arbeten i hus C



Ny kulle utanför Hus C
