

SSV Skördegatans förskola September 2024




Fakta om SSV Skördegatans förskola

Renovering av befintlig förskola, samt utbyggnad av ca 430m² ny förskoleyta inklusive förskolegård. Arbeten kommer att utföras i två etapper med pågående verksamheten i dem delarna som inte omfattas av renoveringen.

Etapp 1 – nybygge av hus D och renovering av hus C. Pågående verksamhet i hus A och B.

Etapp 2 – nybygga av hus D och renovering av hus A och B. Pågående verksamhet i hus B och C.

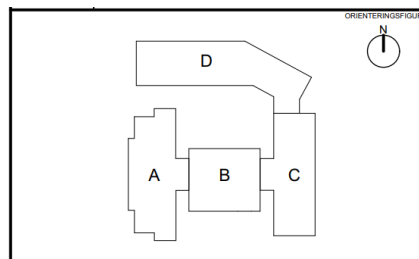

Det här är klart eller pågår

Nytt dagvattenmagasinet är på plats, grundarbeten och VA-arbeten Hus D pågår, rivning i hus ”C” är klar och vi har påbörjat med rumsbildningen.

Det här är på gång

Rördragning under bottenplattan Hus D och installationsarbete i hus C. Efter avslutad grundarbeten Hus D börjar arbeten med bottenplattan v.41 och planeras vara klara v.44. Ställning för takarbeten Hus B och C kommer upp under v.42, rivning tak under v.43 och nytt tak under v.44–45. I slutet av v.43 och början av v. 44 kommer ny fettavskiljare att installeras.

Vårt att notera

Så här långt in i projektet ligger vi i fas och följer vår tidplan.

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Adnan Delkic

Platschef, Serneke Sverige AB

adnan.delkic@serneke.se

079 066 31 12



Grundarbeten Hus D



VA - arbeten Hus D



Daggvattenmagasinet är på plats och ytan återfylld



Rivning i hus C klar, rumsbildning påbörjat

