

SSV Skördegatans förskola November-December 2024




Fakta om SSV Skördegatans förskola

Renovering av befintlig förskola, samt utbyggnad av ca 430m² ny förskoleyta inklusive förskolegård. Arbeten kommer att utföras i två etapper med pågående verksamheten i dem delarna som inte omfattas av renoveringen.

Etapp 1 – nybygge av hys D och renovering av hus C. Pågående verksamhet i hus A och B.

Etapp 2 – nybygga av hus D och renovering av hus A och B. Pågående verksamhet i hus B och C.

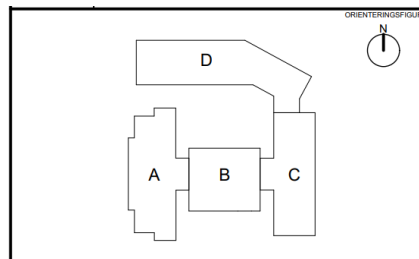

Det här är klart eller pågår

Nytt tak hus B och C är klart. Invändigt i hus C pågår målningsarbeten, montering undertak och installationsarbeten. Utvändigt pågår fin planering av mark vid hus C. Resning av stomme hus D är klar, takläggnings arbete och fasadarbete pågår.

Det här är på gång

Flytspackling av golv i hus D är planerad att göras v.49 och montering av fönster under v.50. Golvlägningsarbete och isolering av vind är planerade arbeten i hus C. Kompletteringsarbeten i hus C dvs montering dörrar, sakvaror, lister m.m. kommer vi att börja med i januari. Måndag, 7/1 kommer vi att stänga av värmen då byte av värmeväxlare ska utföras.

Värt att notera

Projektet flyter på enligt tidplan. Målet är att besikta och överlämna Hus C till verksamheten i månadsskiftet februari-mars.

Vi på Serneke ihop med våra samarbetspartners vill passa på att önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Adnan Delkic

Platschef, Serneke Sverige AB

adnan.delkic@serneke.se

079 066 31 12



Hus C – Kapprum 123



Hus C – Skötrum 131

Nytt tak hus B och C är på gång



Hus C – Team C1 125



Nytt tak hus B och C



Hus D



Hus D invändigt
